



H. AYUNTAMIENTO 2011-2016
MOCORITO
 Gobierno Eficiente
 Crecer con la Gente

MUNICIPIO: MOCORITO
 ZONA PRIORITARIA:
 FONDO: FONDO FEDERALES


FONDOS FEDERALES
 REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
 DIA 15 MES 10 AÑO 2014


HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	PROGRAMA, SUBPROGRAMA NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSION		AVANCE		FECHA		UNIDAD DE MEDIDA	METAS		BENEFICIARIOS
			APROBADA	EJERCIDA	FISICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO		PROGRAMADAS	ALCANZADAS	
1235-00004-00913-00008	FOPEPARIE TRABAJOS DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO (1ER ETAPA), TRAMO ENTRE C. EUSTAQUIO BUELNA Y C. ENRIQUE GONZALEZ EN MOCORITO, SINALOA.	MOCORITO	1,610,451.74	935,742.64	70%	58%	09 DE JUN	EN PROCESO	M2	1,228.00	850.00	5,426
1235-00004-00913-00009	PAVIMENTO DE DOS CALLES EN LA SINDICATURA DE SAN BENITO, EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, SINALOA.	SAN BENITO	5,774,470.43	2,765,415.04	35%	48%	28 DE JUL	EN PROCESO	M2	6,031.00	2,200.00	5,426
	TOTAL DE FOPEPARIE		7,384,922.17	3,701,157.68					M2	7,259.00	3,050.00	
1235-00002-00913-00013	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (RAMO 23) CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE BARRIO (2ª ETAPA) ENMALLADO DE PROTECCION, EN LA CIUDAD DE MOCORITO, SINALOA.	MOCORITO	2,318,206.68	1,131,236.42	60%	49%	12 DE JUN	EN PROCESO	ML	1,189.88	550.00	5,426
	TOTAL DE PAVIMENTACION		2,318,206.68	1,131,236.42					ML	8,448.88	3,600.00	
SUMA TOTAL:			\$ 9,703,128.85	\$ 4,832,394.10								

DR. JOSE ELENO QUINONEZ LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MOCORITO, SINALOA

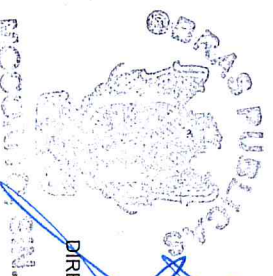

ARO. MARIO LEON RUIZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

